Socogetra

10183 Anhée **Réfection de voirie**

Activités	Quantités
ANHEE	
ORDRE DE DEBUT	**6 mai 2019 - 80 jours ouvrables**
DATE DE FIN	**23-sept-19**
ANHEE	
PHASE 1	**Maquisards, Senenne, Vieilles ruelles**
Installation	Mise en place des déviations
Rue des Maquisards	Terrassements pour purges 300m2 et canalisations
	Démolitions et reposes
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Fondation béton maigre type I
	Pose canalisations 12 m
	Mise à niveau de grilles
Vieilles Ruelles	Terrassements pour purges 50m2
	Géotextile
	Fondation empierrement type I
	Reprofilage
	Accotements
Rue de Senenne	Purges de 60 à 150m2 : 600 m2
	Géotextile
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Délignage 1700m
	Reprofilage
	Accotements
Travaux divers Anhée	Terrassement purge sol impropre
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Fondation béton maigre type I
	Pose filet d'eau 25m
Raclage 4860m2 / Camions (évacuation) / Brosse (nettoyage HP)	
Sciage	Total : 580m
Remise à niveau trapillons	Maquisards (6p)
Enrobés et collage	Total : 8790m2
Traitements joints et bords	Total : 220m
Traitement de surface	Enduit au bitume, bicouche, calibre 4/10 4300m2
PHASE 2	
Installation	Mise en place des signalisations / Déviations
Installation et début des travaux ne demandant pas trop d'emprise	
Rue Rond Fossé	Démontage pavés bordures en PB
	Démolitions diverses et évacuation
	Terrassements divers
	géotextile 20m2
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Béton maigre type I
	Repose pavés bordures en PB 15m2 et 15mct
	Pose filet d'eau 20m
	Tuyaux de raccordement 6m
	Pose d'avaloirs 2p
	Dépose et repose signaux complets
	Reprofilage

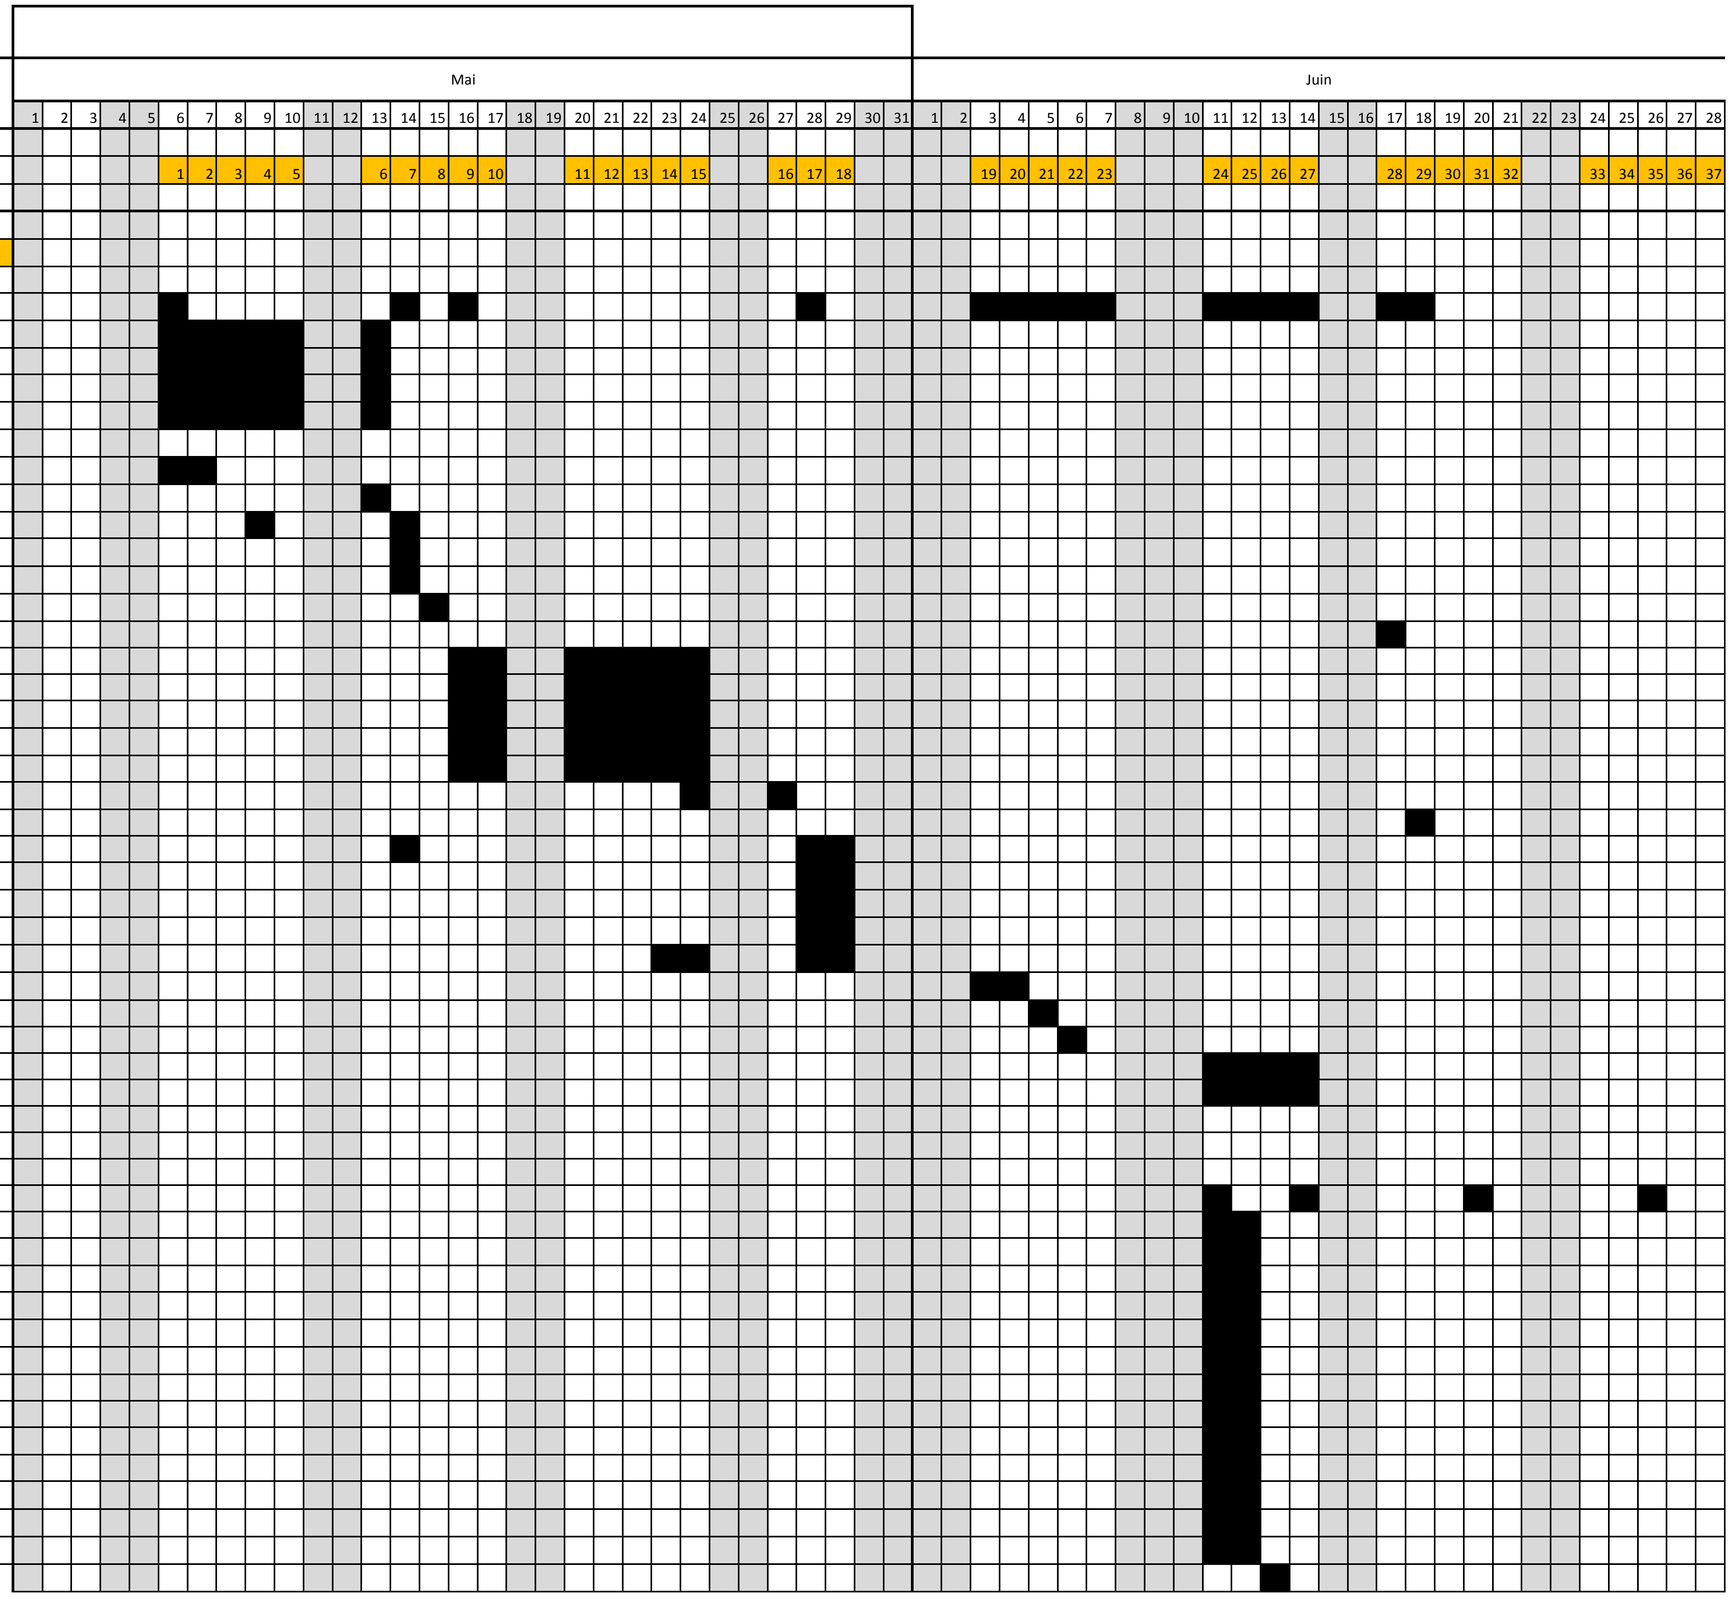

Rue Chérimond	Démolition revêtement hydrocarb. 50m2
	Démolition fondation/sous-fondation
	Géotextile 400m2
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Accotements
	Reprofilage
Rue Alex Daoust	Déblais localisés S 10 à 60m2 purges
	Démolitions diverses et évacuation
	Géotextile 250m2
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Béton maigre type I
	Pose bordures béton 55m + sciage
	Pose filets d'eau 20m + sciage
	Mise à niveu pavés repères 5p
	Reprofilage
	Marquages
Quartier Mossiat	Déblais localisés S 10 à 60m2 purges
	Démolitions diverses et évacuation
	Géotextile 250m2
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Béton maigre type I
	Revêtement béton ép. 20cm 20m2
	Pose bordures béton 20m + sciage
	Pose filets d'eau 40m + sciage
	Raccordement tuyaux sur existant 2p
	Mise à niveau d'avaloirs 2p
	Reprofilage
	Accotements
Rue Roland	Déblais localisés S 10 à 60m2 purges
	Démolitions diverses et évacuation
	Géotextile ???? Manque au bordereau
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Béton maigre type I
	Revêtement béton ép. 20cm 10m2
	Pose filets d'eau 10m + sciage
	Raccordement tuyaux sur existant 2p
	Reprofilage
Tienne de Faux	Déblais localisés S 60 à 150m2 purges
	Démolitions diverses et évacuation
	Géotextile 150m2
	Sous-fondation empierrement type II
	Fondation empierrement type I
	Béton maigre type I
	Pose bandes de contrebutage 120m
	Egouttage 35m
	Drain, empierrement, géotextile 35m
	Mise à gabarit d'un fossé
	Reprofilage
	Accotements
Installation	Remise en place des déviations
Purges plus importantes	
Raclage 7995m2 / Camions (évacuation) / Brosse (nettoyage HP)	
Sciage	Total : 316m
Pose /remise à niveau trapillons (1+2+6+4+3)	
Enrobés et collage	Total : 8695m2
Traitements joints et bords	
Traitement de surface	Enduit au bitume, bicouche, calibre 4/10 850m2
